

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
(FASE DE CONSTRUCCIÓN)
INFORME 2 (22 julio-21 agosto 2022)

Nombre de la instalación	FV Esquedas
Término municipal, Provincia	TM LA SOTONERA, HUESCA
Nombre del titular	Sunrise Ventures 1, SL
CIF del titular	B71359053
Nombre de la empresa de vigilancia	INDYCA
Tipo de EIA	Simplificada
Informe de FASE de:	CONSTRUCCIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	Mensual
Año de seguimiento nº:	AÑO 1
nº de informe y año de seguimiento:	INFORME nº2 del AÑO 1
Período que recoge el informe:	22 julio 2022 – 22 agosto 2022

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN
Término municipal de La Sotonera (Huesca, Aragón)

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

ASISTENCIA AMBIENTAL:
INGENIEROS DACHARY Y CAMARA, S.L.



INFORME PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE OBRA

22 julio- 21 agosto 2022

ÍNDICE GENERAL

MEMORIA

ANEXOS: ACTAS QUINCENALES DE LAS VISITAS DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Anexo 1: ACTA 3

Anexo 2: ACTA 4

ÍNDICE

1.- PETICIONARIO	1
2.- ANTECEDENTES.....	2
3.- FASES DEL PVA.....	4
Fase de replanteo.....	4
Fase de construcción.....	4
4.- DURACIÓN DEL PVA.....	7
5.- CONTROLES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN	8
6.- LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	12
7.- CRONOGRAMA DE VISITAS	13
8.- ALCANCE DEL INFORME	14
9.- REDACCIÓN	15

1.- PETICIONARIO

Sunrise Ventures 1, S.L.

CIF: B71359053

Dirección: Polígono Industrial Santos Justo y Pastor s/n 31510 Fustiñana (Navarra)

2.- ANTECEDENTES

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que se deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas.

El PVA va dirigido a todas las instancias que participen en las obras y en la explotación de la nueva área urbanizada: Contratista, director de las Obras, Organismo Medioambiental competente y otros organismos encargados de la gestión ambiental del territorio. Se desarrolla desde el momento en que se inician las obras y durante el período de garantía, para lo cual cada organismo debe cumplimentar una serie de requisitos.

El PVA deberá cumplir con la legislación vigente, en el sentido de que establece una sistemática para el control del cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.

El PVA tiene como finalidad principal, el llevar a buen término las actuaciones que se han propuesto en el proyecto, dirigidas a la minimización o desaparición de las afecciones ambientales identificadas. Se pretende definir, ordenar y clarificar los diferentes cometidos y funciones de la vigilancia ambiental, debidamente coordinada con la Dirección de Obra y la Dirección de la PSFV, una vez en funcionamiento, así como con el órgano medioambiental competente.

El PVA integra la RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Esquedas” y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de La Sotonera (Huesca), promovido por Sunrise Ventures 1, S.L. (Número de Expediente INAGA 500201/01B/2020/00168).

Este Plan de Vigilancia Ambiental tendrá una vigencia durante toda la vida útil de la Planta Solar Fotovoltaica ampliado hasta los dos años posteriores a la finalización de las labores de desmantelamiento y rehabilitación al final de la vida útil de la planta.

El Plan de Vigilancia Ambiental presta especial atención a la integración paisajística de las plantas, estado de la pantalla vegetal, control de procesos erosivos, afecciones a la vegetación, y a la fauna catalogada como amenazada del entorno e identificada en el documento ambiental, y vigila la permeabilidad del vallado.

Durante la fase de construcción, los informes del Plan de Vigilancia Ambiental serán mensuales y un informe final con conclusiones que resumirá todos los informes anteriores.

Durante la fase de explotación en sus primeros cinco años, los informes de seguimiento serán trimestrales junto con un informe anual con conclusiones. Pasados cinco años y durante la fase de funcionamiento se realizarán informes semestrales y un informe anual que agrupe los anteriores y con sus conclusiones. Durante la fase de desmantelamiento los informes serán mensuales durante el desarrollo de las operaciones y un informe anual con sus conclusiones. Los dos años siguientes a la finalización de los trabajos de desmantelamiento los informes serán trimestrales junto con su informe anual. Durante la fase de explotación, pasados cinco años y en función de los resultados que se obtengan, el promotor podrá solicitar una revisión del plan de vigilancia ambiental ante el órgano sustantivo.

A partir de las indicaciones recogidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de la planta solar fotovoltaica “Esquedas y su infraestructura de evacuación” presentado por la promotora, así como de las que resulten de aplicación en

la RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se desarrollará un seguimiento con el fin de establecer los aspectos que han de ser controlados en el presente programa de vigilancia ambiental.

La metodología a seguir durante la vigilancia ambiental será la siguiente:

- Recogida y análisis de datos, utilizando los procedimientos previamente diseñados.
- Interpretación de los datos. Se estimará la tendencia del impacto y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. Este aspecto podrá ser abordado mediante el análisis comparativo de los parámetros anteriormente referidos frente a la situación preoperacional, así como a otras áreas afectadas por proyectos de similar naturaleza y envergadura.
- Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de Vigilancia Ambiental.
- Retroalimentación, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para efectuar las correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo lo máximo posible a la problemática ambiental suscitada.

3.- FASES DEL PVA

El seguimiento ambiental se ordenará en diversas fases relacionadas con la marcha de las obras y puesta en funcionamiento de la PSFV y tendido eléctrico. En este sentido el PVA se divide en tres fases claramente diferenciadas:

- Fase previa a la construcción: Se ejecutará el replanteo y jalonamiento de la obra (incluyéndose los elementos del medio que, por su valor, deben protegerse especialmente), se localizarán las actividades auxiliares de obra (parque de maquinaria, caminos de obra, parking, zonas de acopio, etc.).
- Fase constructiva: Se corresponde con la etapa de construcción de las obras, y se extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración será la de las obras.
- Fase de explotación: Se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final de la vida útil de la PSFV.
- Fase de desmantelamiento: Se procede al desmontaje de la PSFV y a la restitución de la zona a las condiciones previas a la obra.

Fase de replanteo

En esta fase de llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- Verificación de replanteo de la obra, ubicación de instalaciones y actividades auxiliares (parque de maquinaria, zonas de acopio, punto limpio, etc.).
- Reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración.
- Selección de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, poco numerosos, con parámetros mensurables y comparables.

Aspectos e indicadores de seguimiento

- FR1.-Control del Replanteo y Jalonamiento
- FR2.- Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos

Fase de construcción

Durante la fase de ejecución, el seguimiento y control se centrará en verificar la correcta realización de las obras del proyecto y de las medidas preventivas y correctoras propuestas según las indicaciones del presente documento. Se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se han propuesto medidas preventivas o correctoras. Los controles harán hincapié en:

- Control de la emisión de polvo y partículas
- Control y revisión de maquinaria
- Control de horarios de trabajo (Trabajo diurno)
- Control de la red de drenaje superficial
- Control de la zona afectada por las obras
- Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal
- Control del almacenamiento temporal de sustancias peligrosas
- Control de sustancias peligrosas
- Control del mantenimiento de la maquinaria
- Control de la gestión de residuos

- Control de la limpieza, en particular cubas de hormigón.
- Control y vigilancia para la protección de la fauna
- Control y vigilancia para la protección de la vegetación natural
- Control de mantenimiento de vías de servicio y accesos a propiedades privadas afectadas
- Control de la instalación de cartelería y señalización referida a la obra
- Control y vigilancia arqueológica

Aspectos e indicadores de seguimiento

FOA.- MEDIO FISICO. ATMÓSFERA

- FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria
- FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión.

FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS

- FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos. Controlar que la ubicación y explotación de zonas de préstamos y vertederos no conlleva afecciones no previstas.
- FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria. Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones innecesarias sobre el medio.
- FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas. Minimizar las afecciones producidas como consecuencia de la apertura de viales y zanjas.
- FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
- FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas. Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas de protección contra la erosión.
- FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos. Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados directamente por las obras.

FOC.- MEDIO FÍSICO. HIDROLOGÍA

- FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales

FOD.- MEDIO BIÓTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS

- FOD.1.- Control de los desbroces
- FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural
- FOD.3.- Control del riesgo de incendios

FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA

- FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna
- FOE.2.- Prevención de atropellos de fauna terrestre

FOF.- GESTIÓN DE RESIDUOS

- FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos
- FOF.2.- Gestión de residuos
- FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón

FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE

- FOG.1.- Control de la integración paisajística

FOH.- PATRIMONIO CULTURAL

- FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural

FOI.- MEDIO SOCIOECONÓMICO

- FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial. Verificar que, durante la fase de construcción, y al finalizarse las obras, se mantienen la continuidad de los caminos del entorno de la actuación.
- FOI.2.- Reposición de servicios afectados. Verificar que los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones, que puedan afectar a la población.

FOJ.- OTRAS ACTUACIONES.

- FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra

FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN

- FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal

4.- DURACIÓN DEL PVA

- Fase previa al inicio de las obras
 - Informe técnico inicial de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, en el que se describan y valoren las condiciones generales de la obra en relación con las medidas generales de protección e integración ambiental. Incluirá al menos:
 - Gestiones y trámites necesarios para el inicio de la obra.
 - Estudios previos realizados con anterioridad a la ejecución de las obras
 - Metodología de seguimiento del PVA definido en el Documento Ambiental, incluyendo las consideraciones de la Resolución emitida por el órgano ambiental.
 - Organización, medios y responsabilidades necesarios para la aplicación del PVA
- Fase de construcción
 - Informes ordinarios de periodicidad mensual
 - Informes extraordinarios.
 - Informes específicos.
 - Informe Final Previo a la recepción de las obras.
 - Incluirá también un reportaje fotográfico.
- Fase de explotación
 - Informes ordinarios: en sus primeros cinco años, los informes de seguimiento serán trimestrales junto con un informe anual con conclusiones. Pasados cinco años y durante la fase de funcionamiento se realizarán informes semestrales y un informe anual que agrupe los anteriores y con sus conclusiones.
 - Constará de informes de seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras e informes de los posibles efectos acumulativos (aditivos y/o sinérgicos).
 - Informes extraordinarios.
 - Informes específicos.
 - Informe final.
- Fase de desmantelamiento o abandono
 - Durante la fase de desmantelamiento los informes serán mensuales durante el desarrollo de las operaciones y un informe anual con sus conclusiones. Los dos años siguientes a la finalización de los trabajos de desmantelamiento los informes serán trimestrales junto con su informe anual.

5.- CONTROLES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Fase de construcción

La finalidad del seguimiento y control consistirá en evitar, vigilar y subsanar en lo posible los principales problemas que puedan surgir durante la ejecución de las medidas protectoras y correctoras especialmente en lo que respecta al suelo, la vegetación, la fauna y al paisaje, en una primera fase previniendo los impactos, y en una segunda controlando los aspectos relacionados con la recuperación, en su caso, de los elementos del medio que hayan podido quedar dañados, o bien controlando el desarrollo de los que ocurren en su fase de explotación en lo que se refiere a fauna y a paisaje. Para ello se realizarán visitas de inspección durante esta fase, con una periodicidad que permita controlar el avance de las obras y de las diferentes acciones que se incluyen en el proyecto, a fin de comprobar el adecuado seguimiento de las indicaciones previamente propuestas en los documentos administrativos entre las cuales se pueden destacar:

Fase de construcción (ver actas quincenales)

FOA.- MEDIO FÍSICO. ATMÓSFERA

FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria

- Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características. Se cumplirá con lo especificado la legislación vigente. Se asegurará así la disminución de los gases y ruidos emitidos.
- Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas.
- En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá a realizar una medición del ruido emitido según los métodos, criterios y condiciones establecidas en la legislación vigente.

FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión.

- Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras donde se comprobará que se ejecute el riego de caminos y demás infraestructuras necesarias, mediante camión cisterna o un tractor unido a una tolva.
- Esta medida se mantendrá durante todo el periodo de ejecución de las obras, especialmente en las épocas más secas y con menos periodos de lluvias. Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas empleadas en el riego de las zonas productoras de polvo.
- El agua de riego no debe proceder de la red de abastecimiento urbano.
- Se realizarán inspecciones visuales de los camiones de carga que transporten materiales procedentes de la excavación o utilizados para los movimientos de tierras, garantizando el uso de las lonas en las cajas de los camiones, poniendo especial atención en los que vayan a circular fuera del ámbito del proyecto.

FOB.- MEDIO FÍSICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS

FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos

- En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos o vertederos de materiales, estos contarán con los permisos necesarios de apertura y/o explotación. No son necesarios en ningún de ellos dos parques eólicos iniciados

FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria

- Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada y convenientemente señalizada.

FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas

- Se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con el fin de minimizar pendientes, taludes y movimientos de tierras en general.
- Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en el Proyecto Constructivo.

- Asimismo, se realizarán inspecciones periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos y caminos no programados. En caso de ser necesaria la apertura de un camino o acceso temporal no programado se analizará su incidencia ambiental y se definirán las medidas preventivas y correctoras para la minimización de las afecciones causadas y la restitución a su estado inicial una vez finalizadas las obras. Estos caminos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal

- Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O.
- Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y respetando, en la medida de lo posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo, se propondrán los lugares concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando montones superiores a los 2 metros de altura, y verificando que no se ocupen las zonas de vaguada y laderas
- Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de conservación si fueran precisas.

FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas

- Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad.
- Control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión, como puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de restauración vegetal.
- Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes mediante inspecciones visuales. Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son las indicadas en la DIA.
- En relación con la posterior implantación de una cubierta vegetal, se comprobará que no se lleven a cabo actuaciones que pudieran imposibilitar la implantación y normal desarrollo de dicha cubierta, como la compactación de las superficies de taludes.

FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos

- Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas, esto es, en aquellas zonas donde se haya producido tránsito de maquinaria que haya producido excesiva compactación de suelos.

FOC.- MEDIO FÍSICO. HIDROLOGÍA

FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales

- Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona próxima a las zonas sensibles de ser contaminadas, para ver si se detectan materiales en las proximidades con riesgo de ser arrastrados (aceites, combustibles, cementos u otros sólidos en suspensión no gestionados), así como en las zonas potencialmente generadoras de residuos, como las instalaciones auxiliares de obra o las zonas de acopios de los contenedores de residuos.

FOD.- MEDIO BIÓTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS

FOD.1.- Control de los desbroces

- En aquellas superficies donde sea necesario realizar desbroces se controlará que las superficies desbrozadas son las necesarias y se corresponden con las dimensiones reflejadas en el proyecto.

FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural

- De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de las zonas con vegetación natural que no está prevista en proyecto que sean afectadas por la ejecución de las obras, así como el estado del jalonamiento.

FOD.4.- Control del riesgo de incendios

- No se podrán realizar actividades que generen restos vegetales (desbroces) durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (época de especial riesgo de incendios).
- Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún tipo de máquina que genere chispas, se dispondrán los medios necesarios para la extinción del posible fuego, esto es, presencia de un camión cisterna y/o mochilas de agua con los dispositivos oportunos (desbroces) y extintores (maquinaria generadora de chispas).
- Con el fin de no abandonar combustible altamente inflamable que puede provocar incendios forestales, se procederá a la recogida y traslado a vertedero de todo el material desbrozado lo antes posible. Si por

cualquier razón no se puede proceder a su inmediata recogida, y se necesita una zona para su acopio y recogida posterior, se elegirá una zona libre de riegos de propagación de incendios, siendo responsabilidad de la D.A.O. su ubicación. Se realizará una faja de seguridad de un metro a cada lado de los caminos abiertos como medida de prevención de incendios forestales.

- Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios. De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de las zonas con vegetación natural que no está prevista en proyecto que sean afectadas por la ejecución de las obras, así como el estado del jalonamiento.

FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA

FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna

- Se realizará un muestreo periódico en los terrenos en los que se localizará la instalación renovable por si hubiera nidos de especies catalogadas.

FOE.2.- Prevención de atropellos

- Se realizará una comprobación de la aplicación efectiva de las medidas preventivas y correctoras encaminadas a evitar el atropello de animales en los caminos de acceso.

FOF.- GESTIÓN DE RESIDUOS

FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos

- Se controlará que se dispone de un sistema de punto limpio que garantice la adecuada gestión de los residuos y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras.
- Se dispondrá de contenedores para el depósito de residuos asimilables a urbanos y para la recogida selectiva de residuos no peligrosos de naturaleza no pétreo (palés de madera, restos de ferralla, plásticos, etc.). El punto limpio a instalar en las zonas de instalaciones auxiliares contará con una señalización propia inequívoca.
- Para los residuos peligrosos, la colocación del contenedor se debe realizar sobre terreno con unas mínimas características mecánicas, de impermeabilidad y techado.
- Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia de la instalación renovable. Para ello, se organizarán batidas semanales para la recolección de aquellos residuos que hayan sido abandonados o no llevados a los contenedores oportunos.

FOF.2.- Gestión de residuos

- La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se prevé que se generen en grandes cantidades, se recogerán por las vías ordinarias de recogida de RSU. Si esto no fuera posible, será la propia contrata la encargada de la recogida y depósito en los contenedores de la población más cercana. Se dispondrán de los pertinentes permisos del Ayuntamiento en cuestión, si procede.
- La recogida y gestión de los residuos industriales y peligrosos, se realizará a través de un Gestor Autorizado, inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residuos de Aragón.
- Se comprobará que se procede a dar un tratamiento periódico a los residuos, no permitiendo su acumulación continuada más de seis meses

FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón

- Para la limpieza de los residuos de hormigón, se realizarán pequeñas excavaciones impermeabilizadas, no inferiores al metro y medio de profundidad, donde se procederá a la limpieza de las canaletas de las hormigoneras y demás residuos de hormigón. Una vez llenas se procederá al picado del hormigón y su gestión como residuo.
- Se dispondrán de tantas excavaciones como sean necesarias, aunque se tratará de que sean las mínimas posibles. En la medida de lo posible, en una misma excavación se limpiará el hormigón procedente del hormigonado de varias zapatas.

FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE

- Adecuar las infraestructuras creadas, construyéndola de modo que no suponga una alteración visual impactante y que se integre en la zona de manera adecuada.
- Adoptar medidas correctoras de integración paisajística.

FOH.- PATRIMONIO CULTURAL

FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural

- En materia de patrimonio cultural, si en el transcurso de las obras y movimientos de tierras asociados al proyecto apareciesen restos que puedan considerarse integrantes del Patrimonio Cultural, se deberá comunicar inmediata y obligatoriamente el hallazgo a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para su correcta documentación y tratamiento.

FOI.- MEDIO SOCIOECONÓMICO

FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial

- Se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos provisionales y, en este último caso, la señalización de los mismos.

FOI.2.- Reposición de servicios afectados

- Se verificará el acceso permanente a fincas y parcelas de cultivo, así como la continuidad de las servidumbres afectadas.

FOI.3.- Conservación elementos artificiales afectados

- Minimizar la afección a infraestructuras existentes por afección o cruzamiento de las mismas y reposición de las mismas.

FOJ.- OTRAS ACTUACIONES.

FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra

- Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales.

FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN

FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal

- Se procederá a supervisar la ejecución de un Plan de Restauración Vegetal que devuelva al terreno, en la medida de lo posible, las condiciones que tenía la zona antes de iniciarse las obras. Este informe contará con la supervisión por parte del Departamento de Medio Ambiente.
- Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución del Plan, como son las labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecución de las hidrosiembras o plantaciones (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las semillas, etc.) y, en definitiva, todas y cada una de las acciones que contempla en Plan.

De cada una de las cuestiones revisadas se realizará acta de visita correspondiente (procedente del análisis de los datos recogidos en los partes de comprobación donde se recoja el avance de las obras y posibles incidencias.

Finalizada la obra se ha de comprobar que no se ha generado ningún impacto que pudiera ser subsanable. Para ello se recogerán y procesarán adecuadamente todos los residuos generados siendo el destino de los mismos el gestor adecuado o el vertedero adecuado.

6.- LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Ver Actas quincenales.

7.- CRONOGRAMA DE VISITAS

Se realizarán visitas quincenales.

Se realizarán actas quincenalmente y se emitirán informes mensuales según dicta el Plan de Vigilancia Ambiental.

Las visitas se coordinarán con el jefe de obra.

Las visitas correspondientes al periodo que alcanza este informe han sido realizadas los días:

- 2 de agosto de 2022
- 9 de agosto de 2022

8.- ALCANCE DEL INFORME

- Planta solar fotovoltaica Esquedas y su infraestructura de evacuación
 - Exclusivamente la planta solar, el sistema de evacuación no ha empezado a construirse.
- Alcance

Este informe consta de:

 - Memoria
 - Acta de inicio de obra: Acta 3 (Anexo 1)
 - Actas quincenales: Acta 4 (Anexo 2)
- Fechas
 - De 22 de julio a 21 de agosto de 2022.

9.- REDACCIÓN

El técnico de campo, Jorge Cuevas Tascón y el técnico y encargado del seguimiento y vigilancia del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obras, Ignacio Cámara Martínez, firmante del presente documento, forman parte de la empresa Ingenieros Dachary y Cámara S.L. (INDYCA S.L.), redactor y firmante del EsIA de la planta solar fotovoltaica ESQUEDAS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN ASOCIADA.

Además, se ha contado con el equipo técnico de Sunrise Ventures S.L. para el diseño de las infraestructuras.

En Tudela, en Septiembre de 2022



Ignacio Cámara Martínez
Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 3497
D.N.I.: 07.566.739S

ANEXOS:

ANEXO 1: ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Acta 3

**PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ESQUEDAS Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN**

ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

1.- DATOS GENERALES

ACTA 3. FECHA 02/08/2022	
Fecha	02/08/2022
Periodo	22 julio a 7 agosto 2022
Nº de informe	Acta 3
Redactor	Ignacio Cámara Martínez
Técnico de campo	Jorge Cuevas Tascón
Responsable ambiental	Ignacio Cámara Martínez
Observaciones	Todos los controles y visitas han sido realizadas junto a la Jefa de Obra Sonia Cameselle.

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA

ACTA 3. FECHA 02/08/2022	
PARÁMETROS	OBSERVACIONES
Acondicionamiento del terreno	Se ha terminado esta fase, a falta de suavizar una pendiente en la zona de unión de dos parcelas
Vallado exterior	Se han colocado todos los postes y la malla. Queda pendiente su tensado, construcción de pasos de fauna, colocación de las placas anticolidión y de las puertas de entrada a la PSFV. Después de abrir las zanjas correspondientes paralelas al vallado, se están colocando los tubos y arquetas por donde irán las conducciones de seguridad.
Viales	Se ha terminado la construcción de todos los viales interiores
Zona de Instalaciones auxiliares	Se ha acondicionado una zona cerca del acceso oeste que cuenta con varias casetas de obra para dar servicio a la oficina, los vestuarios, el comedor, y a las contratas
Estacionamientos	Se realizan a un lado de las instalaciones provisionales
Servicios higiénicos temporales	Se han habilitado 2 baños portátiles, uno en las instalaciones provisionales y otro en el acceso este a la obra
Zona de almacenamiento logístico	Se encuentra repartida por toda la extensión de la obra
Subestación de Transformación	Continúan los trabajos de construcción.
Zona de deposición de residuos	Se han habilitado dos puntos limpios, uno para residuos peligrosos y otro para residuos no peligrosos. <ul style="list-style-type: none"> • Punto limpio de residuos peligrosos: se ha habilitado un contenedor de almacenamiento tipo container con cerramiento, que también hace las funciones de almacén. Hasta ahora los residuos, consistentes en botes de spray vacíos, se depositan en una saca etiquetada. Se ha impermeabilizado una zona anexa con lona de plástico y zahorra para mantenimiento de maquinaria. • Punto limpio de residuos no peligrosos: consta de tres contenedores tipo bañera para metal, plástico y cartón, una zona para depósito de residuos de hormigón, y una balsa para limpieza de hormigoneras

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

3.- ACTA SEMANAL

ACTA 3. FECHA 02/08/2022			
PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTORAS
FOA.- MEDIO FISICO. ATMOSFERA			
FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria	Cumplimiento adecuado		
FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión	Por cumplimentar	Hasta el momento se han realizado riegos periódicos de caminos y viales solo durante el tiempo transcurrido entre el 12 de julio y el 1 de agosto. En la actualidad no se dispone de un tractor con cuba para esta tarea.	X
FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS			
FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos	No es de aplicación		
FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria	Cumplimiento adecuado		
FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas	Cumplimiento adecuado		
FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal	Por cumplimentar	Toda la tierra vegetal sobrante en la ejecución de caminos, zanjas y suavizado de pendientes se envía a gestor autorizado	X
FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas	Cumplimiento adecuado	No hay taludes de grandes dimensiones. Terreno bastante llano. No se han dado lluvias importantes.	
FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos	Cumplimiento adecuado		
FOC.- MEDIO FISICO. HIDROLOGÍA			
FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales	Cumplimiento adecuado		
FOD.- MEDIO BIOTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS			
FOD.1.- Control de los desbroces	No es de aplicación	No han sido necesarios, al tratarse de campos de cultivo de secano recién cosechados	

SUNRISE VENTURES 1 S.L.PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN

ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ACTA 3. FECHA 02/08/2022

PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTORAS
FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural	Cumplimiento adecuado	Zona de vegetación natural (Hábitat de interés prioritario) jalonada, algo cubierta de polvo en la parte que linda con el camino de acceso Este, al no haber riegos periódicos.	X
FOD.3.- Control del riesgo de incendios	Cumplimiento adecuado		
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA			
FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna	Cumplimiento adecuado		
FOE.2.- Prevención de atropellos	Cumplimiento adecuado	Existen señales de limitación de velocidad, que se cumplen	
FOF.- GESTION DE RESIDUOS			
FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos	Por cumplimentar	Falta la señalización de los puntos limpios. En el de residuos no peligrosos, en el contenedor de cartón aparecen también envases. El punto limpio de residuos peligrosos también hace la función de almacén y solo dispone de una saca etiquetada para botes de spray vacíos.	X
FOF.2.- Gestión de residuos	Cumplimiento adecuado	Se realiza a través de un Gestor Autorizado	
FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón	Cumplimiento adecuado	Se ha habilitado un lugar para almacenar restos de hormigón y una balsa impermeabilizada para limpieza de hormigoneras.	
FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE			
FOG.1.- Control de la integración paisajística	Cumplimiento adecuado		
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL			
FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural	Cumplimiento adecuado		

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ACTA 3. FECHA 02/08/2022

PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTORAS
FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO			
FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	Cumplimiento adecuado	Falta la señalización de la obra	
FOI.2.- Reposición de servicios afectados	No ha lugar	No se ve afectado ningún servicio	
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES			
FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra	Cumplimiento adecuado	La obra se encuentra en un estado óptimo de orden y limpieza	
FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN			
FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal	No ha lugar (fases posteriores)		

4.- MEDIDAS CORRECTORAS A IMPLEMENTAR

1. Medidas para la protección de la atmósfera:

Se recomienda la disponibilidad en obra de una cuba de agua para riego de caminos, a fin de evitar la dispersión de polvo en suspensión.

En el Informe ambiental se recoge que:

- *Como medida preventiva para evitar el incremento del nivel de polvo y partículas derivadas de los trabajos de construcción, se prescribirá el riego periódico de las zonas desnudas y de todas aquellas áreas que puedan suponer importantes generaciones de polvo, sobre todo en días ventosos.*

2. Medidas para la protección de la geología, geomorfología y los suelos:

Se recomienda el acopio de la tierra vegetal sobrante para su posterior utilización en el proyecto de restauración.

En el Informe ambiental se recoge que:

- *Previamente a los movimientos de tierra, se retirará la capa superior fértil (tierra vegetal) acopiándose en las zonas determinadas, evitando su contaminación con otros materiales. Ésta tierra se utilizará posteriormente para el cubrimiento de superficies desnudas originadas por la obra.*
- *Se habilitará un punto verde para la recogida de los residuos urbanos y asimilables a urbanos que se generen, que serán almacenados en contenedores adecuados a su naturaleza, realizando una separación de los mismos. Deberán ser transportados al Centro de Transferencia más próximo o a cualquier centro adecuado que posibilite su reutilización, reciclado, valoración o eliminación.*
- *Para evitar la contaminación de los suelos se dispondrá de una zona habilitada para minimizar la afcción por actividades potencialmente contaminantes dentro del parque de maquinaria localizado en las instalaciones auxiliares. No se realizarán tareas de mantenimiento de la maquinaria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello.*
- *Deberán disponerse recipientes para recoger los excedentes de aceites y demás líquidos contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria.*
- *En el caso de que se produjeran vertidos accidentales, se procederá inmediatamente a su recogida, almacenamiento y transporte de residuos sólidos, así como al tratamiento adecuado de las aguas residuales.*

3. Medidas para la protección de la vegetación

Se remite a las medidas para la protección de la atmósfera.

En el Informe ambiental se recoge que:

- *Con objeto de disminuir la afección a la vegetación del entorno por depósito de partículas de polvo, y como se ha mencionado anteriormente en el apartado correspondiente a la protección de la calidad del aire, será necesario regar periódicamente los caminos por los que transite la maquinaria para limitar el polvo generado. Esta medida tendrá especial importancia durante las épocas más secas del año.*

4. Residuos y vertidos

Los puntos limpios tienen varios aspectos que corregir.

En el de residuos no peligrosos falta la señalización y hay que vigilar la segregación de residuos y que el lavado de hormigoneras se haga efectivamente dentro de la balsa habilitada.

En el de residuos peligrosos, hace falta prever la generación de diferentes RP, como posibles vertidos de aceites o combustibles, envases de aceites, etc, que necesitarán sus propios contenedores. Se recomienda el uso de bidones, y valorar la utilización del contenedor de barco, que funciona como punto limpio, exclusivamente para los Residuos peligrosos.

En el Informe ambiental se recoge que:

- *Se dispondrá durante la fase de construcción de un sistema de punto limpio que garantice la adecuada gestión de los residuos y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras.*
- *Para su ubicación se dispondrá de una zona, a ser posible adyacente a la de la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra y ocupando preferentemente zonas de cultivo, que se acondicionará de forma adecuada, contemplando la posibilidad de vertidos o derrames accidentales.*
- *El punto limpio a instalar en las zonas de instalaciones auxiliares contará con una señalización propia inequívoca.*
- *Los residuos se segregarán en la propia obra a través de contenedores, acopios separativos u otros medios, de manera que se identifique claramente el tipo de residuo.*
- *Las características de los contenedores estarán acordes con el material que contienen. Así, se dispondrán contenedores para la recogida de residuos asimilables a urbanos y otro para envases y residuos de envases procedentes del consumo por parte de los operarios de obra. La recogida de estos residuos se efectuará por las vías ordinarias de recogida de RSU, o en caso de no ser posible, será la propia contrata la encargada de su recogida y deposición en vertedero.*
- *Se dispondrán también contenedores para la recogida de Residuos No peligrosos, esto es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida de estos residuos*

se efectuará a través de un Gestor Autorizado de Residuos inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residuos de Aragón.

- *Respecto a los residuos peligrosos o industriales, es importante resaltar que según la Ley 22/2011 de Residuos, se obliga a los productores de residuos peligrosos a separar y no mezclar éstos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por tanto, es necesario agrupar los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para, además de cumplir con la legislación, facilitar la gestión de los mismos.*

ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

5.- MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS RESPECTO AL ACTA ANTERIOR

ACTA 3. FECHA 02/08/2022	
PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS
FOA.- MEDIO FISICO. ATMÓSFERA	
FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria	
FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión	Se han realizado riegos periódicos de caminos y viales durante el tiempo transcurrido entre el 12 de julio y el 1 de agosto. En la actualidad no se dispone de un tractor con cuba para esta tarea.
FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS	
FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos	
FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria	
FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas	
FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal	
FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas	
FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos	Se ha impermeabilizado una zona anexa a las instalaciones auxiliares con lona de plástico y zahorra para mantenimiento de maquinaria
FOC.- MEDIO FISICO. HIDROLOGÍA	
FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales	
FOD.- MEDIO BIOTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS	
FOD.1.- Control de los desbroces	
FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural	
FOD.3.- Control del riesgo de incendios	
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA	
FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna	
FOE.2.- Prevención de atropellos	
FOF.- GESTION DE RESIDUOS	
FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos	Se etiquetan correctamente los contenedores de residuos de los puntos limpios
FOF.2.- Gestión de residuos	
FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón	
FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE	
FOG.1.- Control de la integración paisajística	
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL	
FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural	
FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO	
FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	
FOI.2.- Reposición de servicios afectados	
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES	
FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra	

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 3

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ACTA 3. FECHA 02/08/2022

PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS
FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN	
FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal	

6.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO

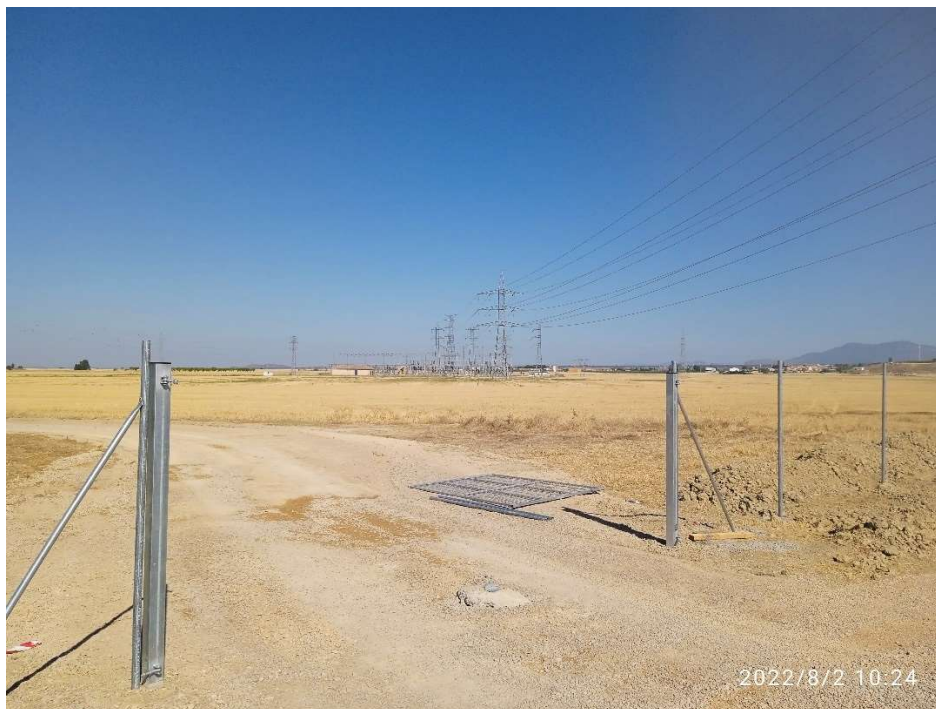


Imagen 1. Acceso principal por el oeste.



Imagen 2. Acceso Este, con vial perimetral terminado, baño químico y zona de acopio



Imagen 3. Vial interior terminado



Imagen 4.- Vallado perimetral, con zanja y arquetas para conducciones de seguridad en fase de construcción.



Imagen 5.- Zona de instalaciones auxiliares.



Imagen 6.- Zona de trabajo en la Subestación de transformación.



Imagen 7. Punto limpio de residuos no peligrosos y balsa para limpieza de hormigoneras

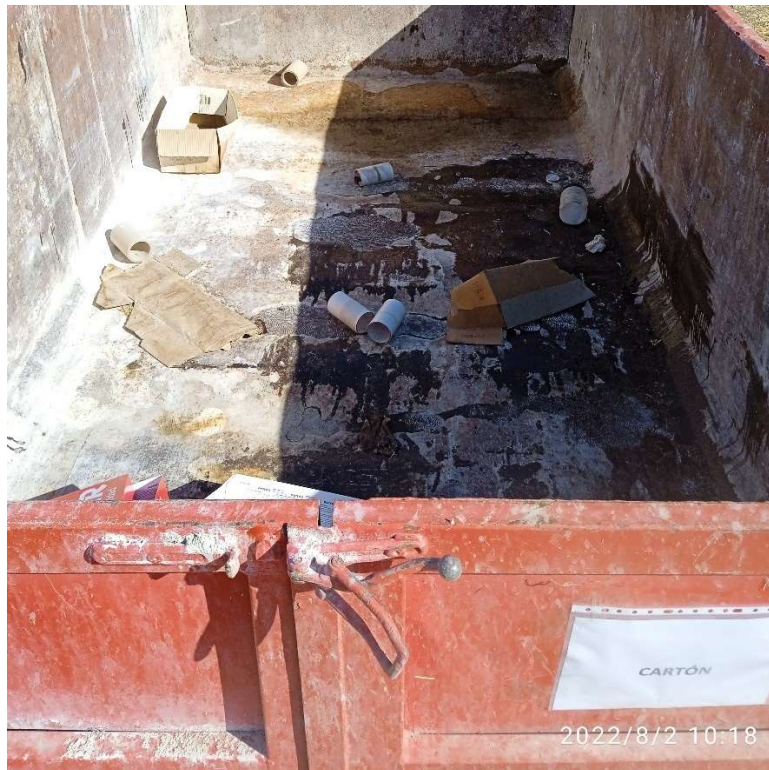


Imagen 8.- Contenedor de cartón bien etiquetado, pero con residuos de envases de plástico.



Imagen 9.- Balsa para limpieza de hormigoneras con restos en los alrededores



Imagen 10.- Zona habilitada para mantenimiento de maquinaria. Punto limpio de residuos peligrosos en contenedor rojo de la derecha.

ACTA 3
PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL



Imagen 11.- Interior contenedor punto limpio de residuos peligrosos. Saca blanca etiquetada para envases de sprays vacíos

ANEXO 2: ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Acta 4

**PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ESQUEDAS Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN**

1.- DATOS GENERALES

ACTA 4. FECHA 09/08/2022	
Fecha	09/08/2022
Periodo	7 agosto a 22 agosto 2022
Nº de informe	Acta 4
Redactor	Ignacio Cámara Martínez
Técnico de campo	Jorge Cuevas Tascón
Responsable ambiental	Ignacio Cámara Martínez
Observaciones	Todos los controles y visitas han sido realizadas junto a la Jefa de Obra Sonia Cameselle.

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA

ACTA 4. FECHA 09/08/2022	
PARÁMETROS	OBSERVACIONES
Acondicionamiento del terreno	Se ha terminado esta fase, a falta de suavizar un talud en la zona de unión de dos parcelas (Imagen 1)
Señalización	Se han señalado los accesos con las normas de velocidad y de prevención de riesgos laborales. (Imágenes 2, 3 y 4)
Vallado exterior	Se han colocado todos los postes y la malla. Queda pendiente su tensado, construcción de pasos de fauna, colocación de las placas anticolidión y de las puertas de entrada a la PSFV. Después de colocar los tubos y arquetas por donde irán las conducciones de seguridad paralelas al vallado, se están rellenando las zanjas y construyendo las zapatas y soportes de los correspondientes postes. (Imágenes 5 y 6)
Viales	Se ha terminado la construcción de todos los viales interiores
Centros de Transformación (C.T.s)	Han comenzado las obras de los 3 C.T.s: Se ha acondicionado el terreno y se están terminando las bases sobre las que irán colocados, y abriendo las zanjas para las conducciones de media tensión. (Imágenes 7, 8 y 9)
Zona de Instalaciones auxiliares	Situada en las cercanías del Acceso Principal, se le han sumado nuevas casetas de obra. El abastecimiento eléctrico se realiza gracias a un grupo electrógeno. (Imagen 10)
Subestación de Transformación	Continúan los trabajos de construcción de los cimientos. (Imagen 11)
Zona de almacenamiento logístico	Se encuentra repartida por toda la extensión de la obra
Zona de deposición de residuos	Se han habilitado dos puntos limpios, uno para residuos peligrosos y otro para residuos no peligrosos. <ul style="list-style-type: none"> Punto limpio de residuos peligrosos: se ha habilitado un contenedor de almacenamiento tipo container con cerramiento, que también hace las funciones de almacén. Hasta ahora los residuos, consistentes en botes de spray vacíos, se depositan en una saca etiquetada.

	<p>Se ha impermeabilizado una zona anexa con lona de plástico y zahorra para mantenimiento de maquinaria.</p> <p>Aún así, aparecen derrames de aceite en el suelo situado a la entrada del container de RP, resultado de la carga, descarga y repostaje de los generadores eléctricos guardados en él. (Imagen 13)</p> <ul style="list-style-type: none">• Punto limpio de residuos no peligrosos: consta de tres contenedores tipo bañera para metal, plástico y cartón, una zona para depósito de residuos de hormigón, y una balsa para limpieza de hormigoneras
--	---

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

3.- ACTA QUINCENAL

ACTA 4. FECHA 09/08/2022			
PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTORAS
FOA.- MEDIO FISICO. ATMOSFERA			
FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria	Cumplimiento adecuado		
FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión	Por cumplimentar	En la actualidad no se dispone de un tractor con cuba para realizar riegos periódicos de caminos y viales	X
FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS			
FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos	No es de aplicación		
FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria	Cumplimiento adecuado		
FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas	Cumplimiento adecuado		
FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal	Por cumplimentar	Toda la tierra vegetal sobrante en la ejecución de caminos, zanjas y suavizado de pendientes se envía a gestor autorizado	X
FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas	Cumplimiento adecuado	No hay taludes de grandes dimensiones. Terreno bastante llano. No se han dado lluvias importantes.	
FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos	Cumplimiento adecuado		
FOC.- MEDIO FISICO. HIDROLOGÍA			
FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales	Cumplimiento adecuado		
FOD.- MEDIO BIOTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS			
FOD.1.- Control de los desbroces	No es de aplicación	No han sido necesarios, al tratarse de campos de cultivo de secano recién cosechados	
FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural	Cumplimiento adecuado	Zona de vegetación natural (Hábitat de interés prioritario) jalonada, algo cubierta de polvo en la parte que linda con el camino de acceso Este, al no haber riegos periódicos.	X
FOD.3.- Control del riesgo de incendios	Cumplimiento adecuado		

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ACTA 4. FECHA 09/08/2022

PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECToras
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA			
FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna	Cumplimiento adecuado	Se encuentra lo que parece una rata en descomposición en un cubo lleno de agua. (Imagen 12)	X
FOE.2.- Prevención de atropellos	Cumplimiento adecuado	Existen señales de limitación de velocidad, que se cumplen	
FOF.- GESTION DE RESIDUOS			
FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos	Por cumplimentar	<p>Falta la señalización de los puntos limpios.</p> <p>El punto limpio de residuos peligrosos también hace la función de almacén y solo dispone de una saca etiquetada para botes de spray vacíos.</p> <p>Aunque se ha impermeabilizado una zona anexa con lona de plástico y zavorra para mantenimiento de maquinaria, aparecen derrames de aceite en el suelo situado a la entrada del container de RP, resultado de la carga, descarga y repostaje de los generadores eléctricos guardados en él. (Imagen 13)</p> <p>En el de residuos no peligrosos, en el contenedor de cartón siguen apareciendo también envases de plástico. (Imagen 14)</p> <p>Además, en la zona contigua al contenedor que funciona como almacén de una de las contratas se encuentran varias sacas con residuos mezclados en su interior. (Imágenes 14 y 15)</p> <p>En el interior de la oficina de la Dirección de Obra se dispone de dos cubos para residuos asimilables a domésticos. (Imagen 16)</p>	X
FOF.2.- Gestión de residuos	Cumplimiento adecuado	Se realiza a través de un Gestor Autorizado	
FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón	Por cumplimentar	Aunque ha habilitado un lugar para almacenar restos de hormigón y una balsa impermeabilizada para limpieza de hormigoneras, se observa cómo parte de la limpieza se realiza fuera de ella y que hay restos de hormigón en los alrededores. (Imagen 17)	X
FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE			
FOG.1.- Control de la integración paisajística	No ha lugar (fases posteriores)		

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

ACTA 4. FECHA 09/08/2022

PARAMETROS OBSERVADOS	ACTA DE VISITA	OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTORAS
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL			
FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural	Cumplimiento adecuado		
FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO			
FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	Cumplimiento adecuado	Se ha señalado la obra en sus dos entradas.	
FOI.2.- Reposición de servicios afectados	No ha lugar	No se ve afectado ningún servicio	
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES			
FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra	Cumplimiento adecuado	La obra se encuentra en un estado óptimo de orden y limpieza	
FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN			
FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal	No ha lugar (fases posteriores)		

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

4.- MEDIDAS CORRECTORAS A IMPLEMENTAR

PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS RESOLUCIÓN INAGA	MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR
FOA.- MEDIO FÍSICO. ATMÓSFERA		
FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria		No
FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión	Como medida preventiva para evitar el incremento del nivel de polvo y partículas derivadas de los trabajos de construcción, se prescribirá el riego periódico de las zonas denudadas y de todas aquellas áreas que puedan suponer importantes generaciones de polvo, sobre todo en días ventosos.	Se recomienda la disponibilidad en obra de una cuba de agua para riego de caminos, a fin de evitar la dispersión de polvo en suspensión
FOB.- MEDIO FÍSICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS		
FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos		No
FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria		No
FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas		No
FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal	La tierra vegetal retirada será acopiada de manera óptima, en cordones, para su posterior utilización en las labores de recuperación ambiental. Se favorecerá la revegetación natural en las zonas libres donde no se vaya a instalar ningún elemento de la planta y que queden dentro del perímetro vallado de las mismas. Para ello se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal sobrante en la ejecución de la planta de manera que se aproveche el banco de semillas que albergue. Estos terrenos recuperados se incluirán en el plan de restauración y en el plan de vigilancia, para asegurar su naturalización	Toda la tierra vegetal que se extraiga en labores como el suavizado de taludes o en el cajeadado de los viales se depositará en algún lugar para utilizarla después en la revegetación de los terrenos a recuperar
FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas		No
FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos		No
FOC.- MEDIO FÍSICO. HIDROLOGÍA		
FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales		No

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS RESOLUCIÓN INAGA	MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR
FOD.- MEDIO BIÓTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS		
FOD.1.- Control de los desbroces		No
FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural	Como medida preventiva para evitar el incremento del nivel de polvo y partículas derivadas de los trabajos de construcción, se prescribirá el riego periódico de las zonas denudadas y de todas aquellas áreas que puedan suponer importantes generaciones de polvo, sobre todo en días ventosos.	Se recomienda la disponibilidad en obra de una cuba de agua para riego de caminos, a fin de evitar la dispersión de polvo en suspensión
FOD.3.- Control del riesgo de incendios		No
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA		
FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna	Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el entorno de estas instalaciones, con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves necrófagas o carroñeras que pudieran sufrir accidentes, así como para evitar la proliferación de otro tipo de fauna terrestre oportunista. En todo caso, se deberá dar aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona, los cuales indicarán la forma de proceder.	Vigilar la aparición de animales muertos y proceder a su eliminación inmediatamente. En este caso, una rata muerta, no parece necesario dar aviso a los APNs, pero sí retirarla para evitar que haga efecto llamada a otros animales y por razones de salubridad.
FOE.2.- Prevención de atropellos		No
FOF.- GESTIÓN DE RESIDUOS		
FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos	Se tomarán las medidas oportunas para evitar vertidos (aceites, hormigón, combustibles, etc.). Los cambios de aceites, reparación de maquinaria o limpieza de hormigoneras se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, alejadas de los cauces de barrancos, arroyo o cualquier otro punto de agua. Todos los residuos que se pudieran generar durante las obras, así como en fase de explotación, se deberán retirar y gestionar adecuadamente según su calificación y codificación, debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial o residuo. Los residuos generados se almacenarán de manera separada de acuerdo a su clasificación y condición. Se adoptarán todas las medidas necesarias para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos como solera impermeable, cubeto de contención, cubierta, etc.	Para llevar a cabo el repostaje y el mantenimiento de maquinaria, utilizar la zona específica habilitada, en la que se ha impermeabilizado el suelo y es posible recoger los derrames que se produzcan. Vigilar la separación adecuada de los residuos en sus respectivos contenedores según su calificación y codificación. Vigilar que las contratas cumplan con lo anterior. Se recomienda disponer de contenedores para residuos asimilables a domésticos de fácil acceso para todos los trabajadores.
FOF.2.- Gestión de residuos	Se realizará a través de un Gestor Autorizado	No

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS RESOLUCIÓN INAGA	MEDIDAS CORRECToras A APLICAR
FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón	La limpieza de hormigoneras se realizará en zonas expresamente destinadas para ello	Vigilar que se hace efectivamente en la balsa habilitada
FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE		
FOG.1.- Control de la integración paisajística	Se ejecutará una franja vegetal de 8 m de anchura en el flanco norte del vallado perimetral. Esta franja vegetal se realizará con especies propias de la zona de tipo arbustivo o arbóreo, ya sean frutales, quercíneas u otras que alcancen, al menos, los 2 m de altura, mediante plantaciones al trespelillo de plantas procedentes de vivero de al menos dos savias en una densidad suficiente, de forma que se minimice la afección de la instalación fotovoltaica en el paisaje.	Se recomienda que se deje espacio para esta franja vegetal en toda la mitad superior de la PSFV que mira al norte.
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL		
FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural		No
FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO		
FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial		No
FOI.2.- Reposición de servicios afectados	No se ve afectado ningún servicio	No
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES		
FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra	La obra se encuentra en un estado óptimo de orden y limpieza	No
FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN		
FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal		No

ACTA 4
PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
5.- MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS RESPECTO AL ACTA ANTERIOR

ACTA 4. FECHA 09/08/2022	
PARAMETROS OBSERVADOS	MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS
FOA.- MEDIO FISICO. ATMÓSFERA	
FOA.1.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria	
FOA.2.- Control del aumento de las partículas en suspensión	
FOB.- MEDIO FISICO. GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS	
FOB.1.- Zonas de préstamos y vertederos	
FOB.2.- Control del movimiento de la maquinaria	
FOB.3.- Control de la apertura de caminos y zanjas	
FOB.4.- Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal	
FOB.5.- Control procesos erosivos. Suelos, taludes y laderas	
FOB.6.- Control de la alteración y compactación de suelos	Se circula habitualmente por los caminos habilitados.
FOC.- MEDIO FISICO. HIDROLOGÍA	
FOC.1.- Control de la calidad de las aguas superficiales	
FOD.- MEDIO BIOTICO. VEGETACIÓN, HABITATS E INCENDIOS	
FOD.1.- Control de los desbroces	
FOD.2.- Vigilancia de la protección de la vegetación natural	
FOD.3.- Control del riesgo de incendios	
FOE.- MEDIO BIÓTICO. FAUNA	
FOE.1.- Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna	
FOE.2.- Prevención de atropellos	
FOF.- GESTION DE RESIDUOS	
FOF.1.- Recogida, acopio y tratamiento de residuos	En general se separan correctamente los residuos generados, pero hay que vigilar las pequeñas excepciones.
FOF.2.- Gestión de residuos	
FOF.3.- Gestión de residuos de hormigón	
FOG.- MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE	
FOG.1.- Control de la integración paisajística	
FOH.- PATRIMONIO CULTURAL	
FOH.1.- Control arqueológico y del patrimonio cultural	
FOI.- MEDIO SOCIOECONOMICO	
FOI.1.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	
FOI.2.- Reposición de servicios afectados	
FOJ.- OTRAS ACTUACIONES	
FOJ.1.- Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra	
FOK.- PLAN DE RESTAURACIÓN	
FOK.1.- Control de la ejecución del Plan de Recuperación de la cubierta vegetal	

6.-REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Talud a suavizar, cercano a zona de instalaciones auxiliares.



Imagen 2. Acceso principal señalizado.



Imagen 3. Acceso Este a la PSFV señalado.



Imagen 4.- Señalización en las entradas a la obra.



Imagen 5.- Hormigonado de zapata para los postes de las instalaciones de seguridad.



Imagen 6.- Trabajos en instalaciones de seguridad: arqueta, soporte para poste y zanja a medio cubrir.



Imagen 7. Trabajos en la base de uno de los tres C.T.s y en la zanja para conducciones de media tensión.



Imagen 8. Base de uno de los CTs hormigonada.



Imagen 9.- Máquina trabajando en la zanja para conducción de media tensión.



Imagen 10.- Grupo electrógeno anexo en zona de instalaciones auxiliares para abastecimiento eléctrico.



Imagen 11.- Trabajos en los cimientos de la futura Subestación de la PSFV.



Imagen 12.- Roedor en descomposición en cubo con agua cerca de obras de Subestación.



Imagen 13.- Derrames en la entrada del contenedor que funciona como Punto limpio de Residuos peligrosos.



Imagen 14.- Sacas con residuos mezclados al lado del almacén (contenedor azul) de una de las contratas.



Imagen 15.- Sacas con residuos mezclados (madera, papel y plástico) al lado del almacén de una de las contratas.



Imagen 16.- Cubos para residuos asimilables a domésticos generados por trabajadores de la obra, ubicados en la oficina de la Dirección de Obra.



Imagen 17.- Limpieza de hormigonera fuera de la balsa. Se observa que es un procedimiento habitual por los restos de los alrededores.

SUNRISE VENTURES 1 S.L.

PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA ESQUEDAS
Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN



ACTA 4

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
